


門前クリーンパークの建設は、(株)熊谷組の施工で、2018年12月10日に着工し、半年が経過しました。現時点での伐採工事と濁水対策工事の状況について整理しました。引き続き、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

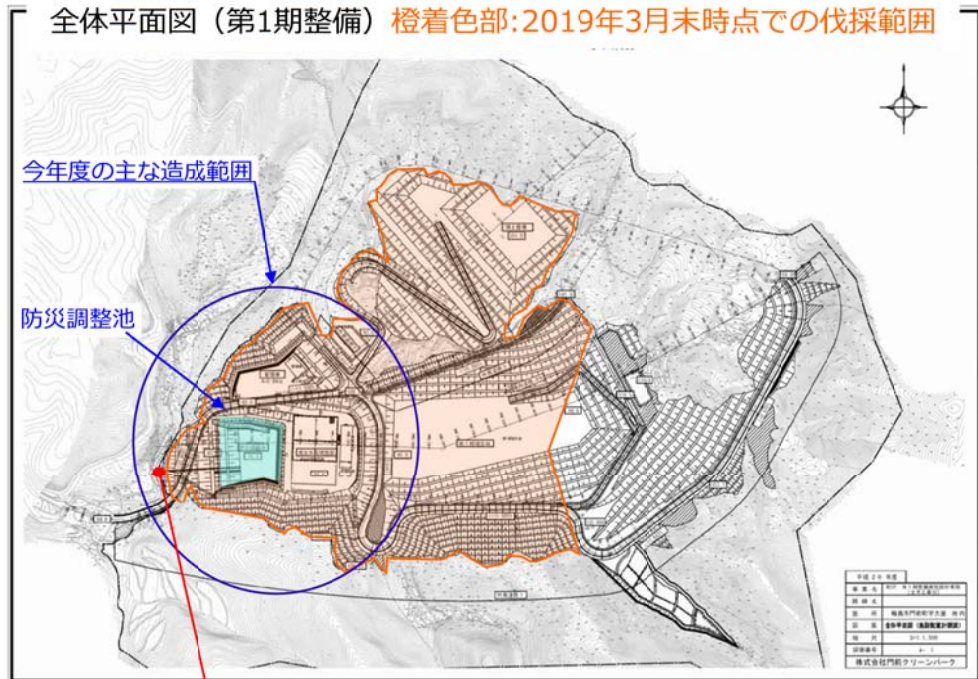

○伐採工事

樹木伐採工事に関しては、保全対象種であるノスリの繁殖活動に配慮し、3月末時点で一旦、中断しました。その時点での伐採割合は、第1期工事範囲の、約7割となります。（左図面の着色部）

今後は、保全対象種の繁殖活動に応じて、作業を再開していきます。



伐採工事の様子

○今後の工程

工事期間は3年間を予定しており、今年度は、防災調整池の築造、貯留構造物等の造成工事が主な内容となります。

| 主な工程 | 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | |
|-----------|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|--|
| | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | |
| 準備工 | | — | | | | | | | | | | | | | | |
| 伐採工事 | | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| 濁水対策工事 | | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| 造成工事 | | | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | |
| 防災調整池工事 | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | |
| 集排水管工事 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 遮水工事 | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | | | |
| 浸出水処理施設工事 | | | | | | | | | | | | | — | — | — | |
| 後片付け等 | | | | | | | | | | | | | | | — | |

注：工程は予定であり、工事の進捗により変更されます。

○濁水対策工事

工事による濁水の発生を抑制するため、5箇所の仮設沈砂池を設置しました。この沈砂池は、濁水中の土砂などを沈降させて、取り除くことを目的としています。

さらに、仮設沈砂池だけでは濁水の処理が不十分な場合は、最下流に設置した濁水処理プラントを稼働させ、河川に放流します。



仮設沈砂池（計5箇所設置）



濁水処理プラント
