


2021年度第2四半期(2021年7月～9月)の施工内容について、お知らせします。主に防災調整池付近や残土（覆土）仮置場の造成工事を実施しております。また、濁水対策は工事の進捗に合わせて継続して実施しています。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



○防災調整池の工事

防災調整池の設置工事を進めています。防災調整池の側面には大型ブロックを設置しています。

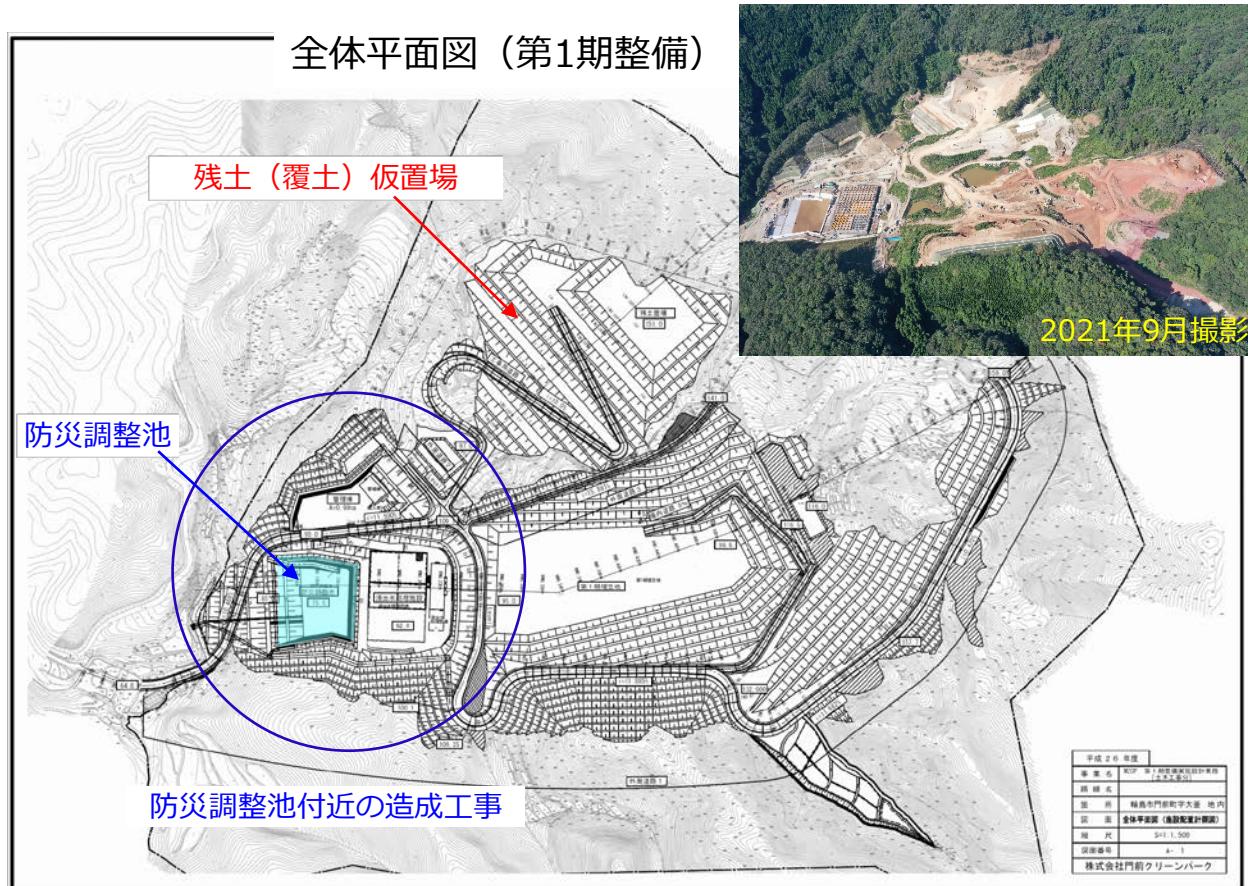

工事の様子

○残土（覆土）仮置場の工事

残土（覆土）仮置場の造成工事を進めています。仮置場の前面には、植生シートを敷設しています。



工事の様子

○今後の工程

工事期間は3年間を予定しておりましたが、保護対象種とした鳥類への配慮や埋蔵文化財の調査、降雪の影響等により、延伸しております。

主な工程	2018	2019				2020				2021				2022				
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	
準備工	■																	
伐採工事		■						■										
濁水対策工事		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
造成工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
防災調整池工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	
集排水管工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
遮水工事												■	■	■	■	■	■	■
浸出水処理施設工事												■	■	■	■	■	■	■
後片付け等																		■

注：工程は予定であり、工事の進捗により変更されます。
