


2019年度第2四半期(7月～9月)の施工内容について、お知らせします。防災調整池付近の造成工事や家屋の解体工事、伐根材（伐採した樹木の根）の処理等を行いました。
引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



○家屋解体工事

大釜北側集落の解体工事を行いました。南側集落の解体工事は、本年7月に完了しました。

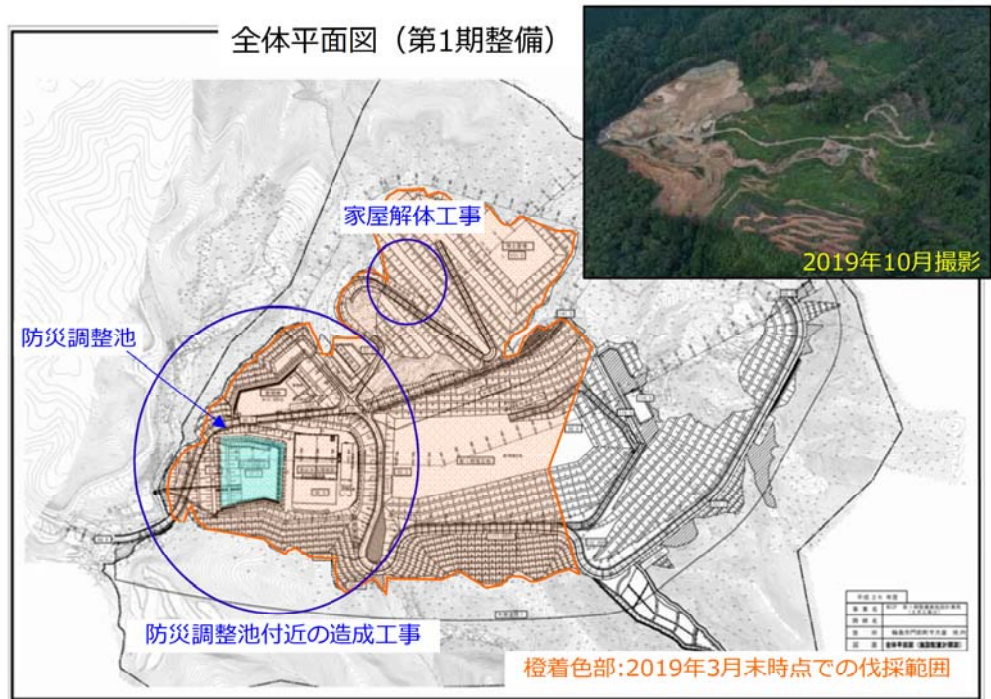

解体工事の様子

○今後の工程

工事期間は3年間を予定しており、今年度は、防災調整池の築造、貯留構造物等の造成工事が主な内容となります。

主な工程	2018		2019				2020				2021				2022	
	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	7～9	10～12	1～3	4～6	
準備工		■														
伐採工事		■	■		■											
濁水対策工事		■	■													
造成工事			■	■	■	■	■	■	■							
防災調整池工事				■	■											
集排水管工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
遮水工事								■	■	■	■	■				
浸出水処理施設工事								■	■	■	■	■	■			
後片付け等															■	

注：工程は予定であり、工事の進捗により変更されます。

○防災調整池等の工事

造成工事に加え、防災調整池等からの排水管の敷設工事を一部行いました。



造成工事の様子
