


2019年度第3四半期(2019年10月～12月)の施工内容について、お知らせします。防災調整池付近の造成工事および法面の造成工事を行いました。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。



○法面造成工事

法面の切土工事を行い、完了した法面には植生マットの敷設を行いました。また、切土工事には、重機に自動制御装置が組み込まれている（ICT）を用い、施工を行っています。

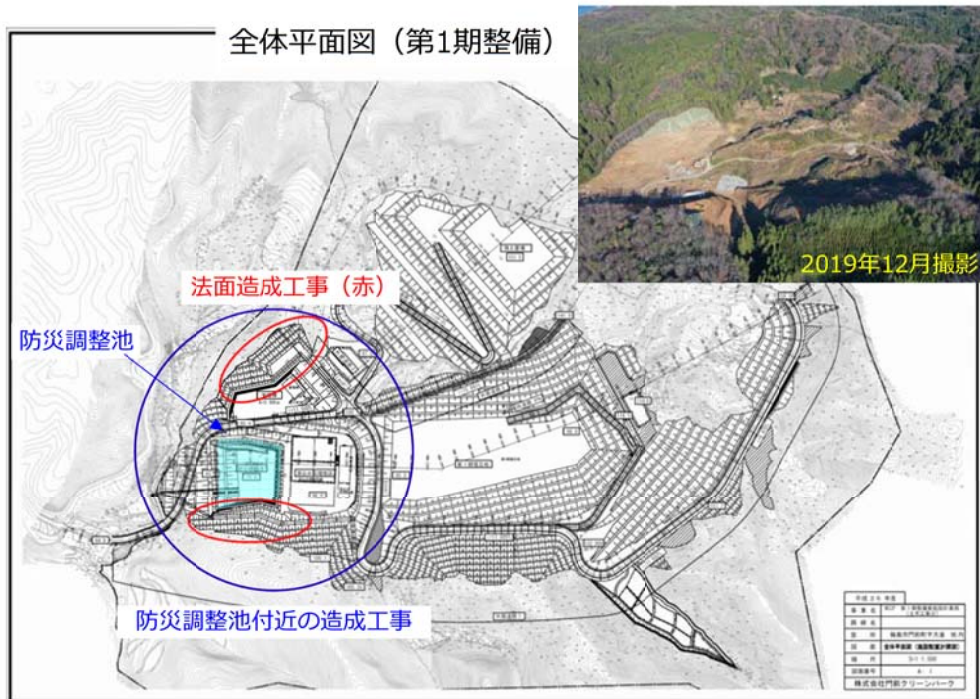

工事の様子

○今後の工程

工事期間は3年間を予定しており、今年度は、防災調整池の築造、貯留構造物等の造成工事が主な内容となります。

主な工程	2018		2019				2020				2021				2022	
	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	
準備工		■														
伐採工事			■													
濁水対策工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
造成工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
防災調整池工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
集排水管工事				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
遮水工事																
浸出水処理施設工事																
後片付け等																

注：工程は予定であり、工事の進捗により変更されます。

○防災調整池等の工事

防災調整池の堰堤築造工事を進めています。盛土の実施にあたっては強度のチェックを行いながら実施しています。



工事の様子
