


2020年度第4四半期(2021年1月～3月)の施工内容について、お知らせします。主に防災調整池付近や残土（覆土）仮置場の造成工事を実施しております。また、濁水対策強化のため、濁水処理装置を増設しました。引き続き、環境に配慮し安全に工事を実施してまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

全体平面図（第1期整備）

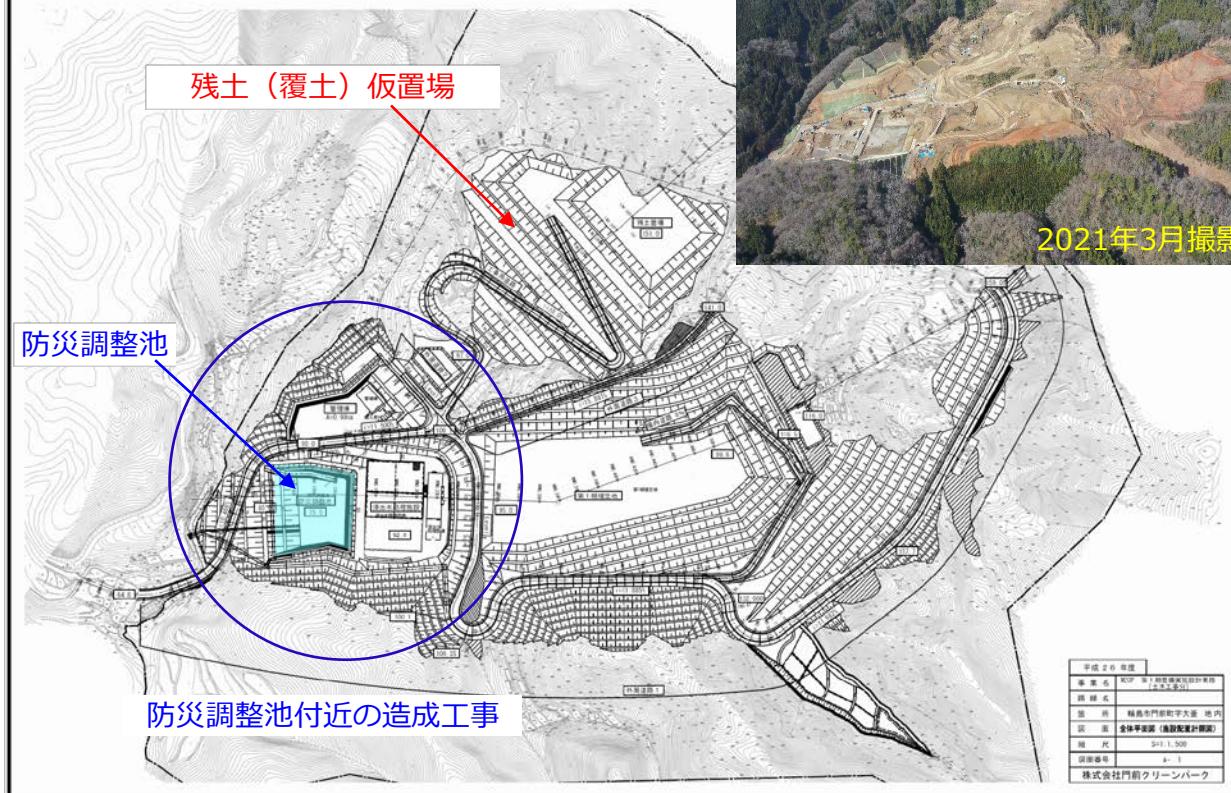

○防災調整池等の工事

防災調整池の設置工事を進めています。防災調整池の側面には大型ブロックによる擁壁を設置しています。



工事の様子

○濁水処理装置

設置数：3基（2021年3月増設）  
処理能力：計6,700m<sup>3</sup>/日



○残土（覆土）仮置場の工事

残土（覆土）仮置場を造成工事を進めています。仮置き場の底面には、浸透した雨水を排水するために排水管を敷設しています。



工事の様子

○今後の工程

今後の工程については、保護対象種とした鳥類への配慮や埋蔵文化財の調査、降雪の影響による工事の進捗状況を踏まえ、精査を行っております。
